

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

38.262

Datum van bezoek:

13-02-2024

Plaats van het onderzoek:

Frankrijklei 8 2000 Antwerpen België

Testeur d'installation:**Inspecteur:**

Hasan Ozdemir

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-037/6278044

De datum van opstelling:

V1 13-02-2024 14:21:41

Volgend controlebezoek:

13-02-2049

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique

Telefoon

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP
AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Frankrijklei 8 2000 Antwerpen België

Appartement aanduiding

3de voorkant

Gebouw

Appartement 3de verdieping voorkant / A3

Eigenaar

Chaya Berger

Adres van de eigenaar

Frankrijklei 8 2000 Antwerpen België

Installateur

Chaya Berger

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

5697929

EAN code

541448812037441300

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

1 X 400 V + N

Maximum beveiliging

32 A 2P

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	1X2P DIFF 40A 30mA TYPE A Zie schema		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Baar		
Weerstand aardelektrode (Ω)	11		
Isolatiemeting ($M\Omega$)	107,3		

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.


Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

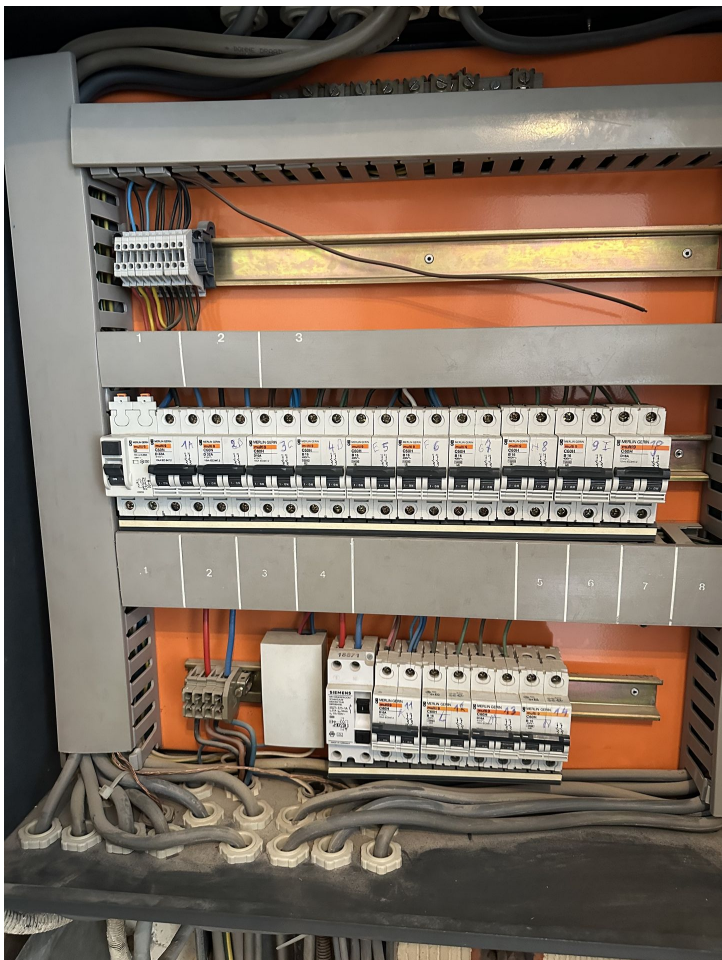

Verdeelbord 1

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.	RDE3
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
De eenheid was gemeubileerd ten tijde van de inspectie.	RDE15
Bewoordingen	Foto
